

השלב הראשון: תכנון מקורי והיערכות לביצוע

תכנון מוקפד להצבת שני מבני
שירותים ומקלחות (שו"מים) ופילוסם
בשטח.



הזמנת ציוד ושינוע לוגיסטי לאתר
להתחלת ביצוע מיידית.



היערכות לחיבור המבנים למערכות
ביוב, מים וחשמל קיימות.




התפתחות בשטח: חשיפת כשלים בתשתית הקיימת

שלב 1: תחילת עבודות חפירה וגילוי תקלות תשתית בלתי צפויות.

שלב 2: שטיפה יסודית וצילום פנים-צנרת להערכת מצב מדויקת.

פעולה מקבילה: שאיבה, ניקוי ותיקון מערכת המשאבות במבנה טופז.

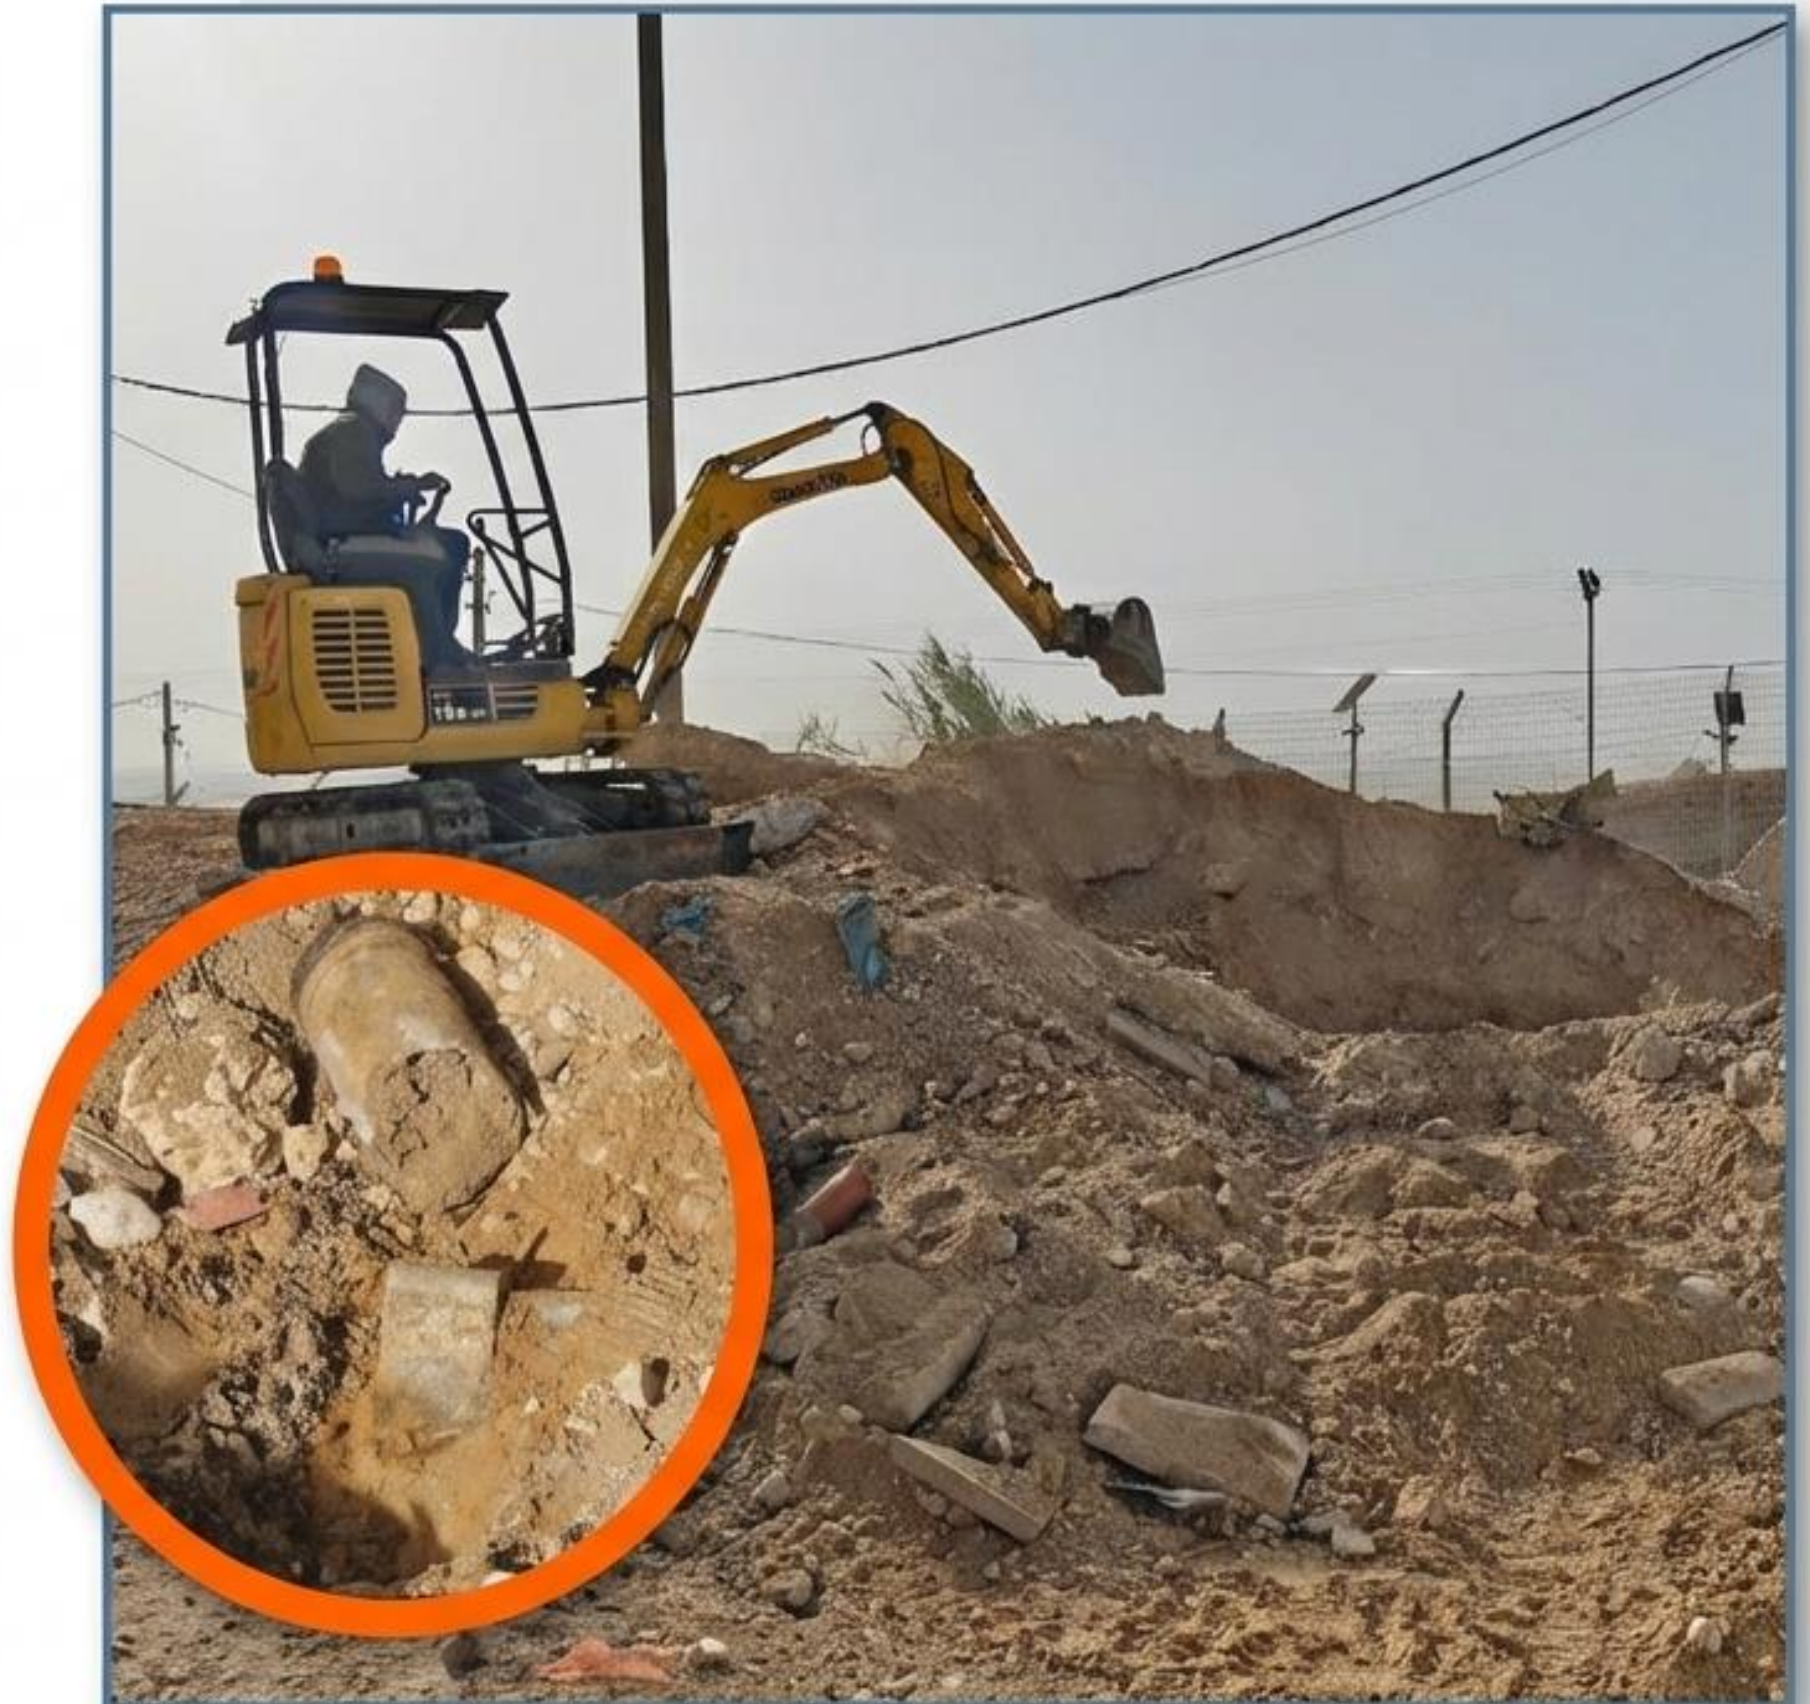

אבחון הנדסי: זיהוי שורש הבעיה

ממצא מרכזי

Assistant

כשל הנדסי מהותי בתשתית
הישנה שנחשף בחפירה.

אבחון התקלה

Assistant

אותר שיפוע הפוך בתוואי הקיים,
המונע זרימה וגורם לסתימות.

החלטה מקצועית

Assistant

פסילת תיקון מקומי והחלפת קו
הביוב והשוחות מן היסוד.



ביצוע הפתרון: תיקון התוויה והנחת תשתית חדשה

1 פילוס לייזר: ביצוע מדידות גבהים קפדניות להבטחת זרימה גרביטציונית.

1

2 כיול גבהים: הצבת שוחת ביוב חדשה והגבהתה בכ-10 ס"מ לביטול השיפוע ההפוך.

2

3 תשתית חדשה: הנחת קו צנרת תקני על מצע חול תוך שמירה על שיפועים הנדסיים.

3



השלמת הפרויקט: עבודות גמר ואישורים סופיים

✓ **חשמל:** השלמת חיבורים, ביצוע בדיקות מקיפות וקבלת אישור בודק מוסמך.

✓ **מערכות נלוות:** התקנה מלאה של פאנלים סולריים והצבת שוקת שטיפה חיצונית.

✓ **מסירה:** המבנים מפולסים, מחוברים לתשתיות חדשות ומוכנים לשימוש מלא ללא דופי.

